




Auftragsnachkalkulation

Aktueller kaufmännischer Stand der Baustelle

Um über den voraussichtlichen Erfolg oder Misserfolg einer Baustelle jederzeit informiert zu sein, ist die Bauführung darauf angewiesen, über möglichst aktuelle und vollständige Zahlen zu verfügen. Die Auftragsnachkalkulation versteht sich als Ergänzung zur kaufmännischen Kostenrechnung. In diesem Softwaremodul werden die aktuellsten Informationen aus allen installierten SORBA-Softwaremodule bezogen.

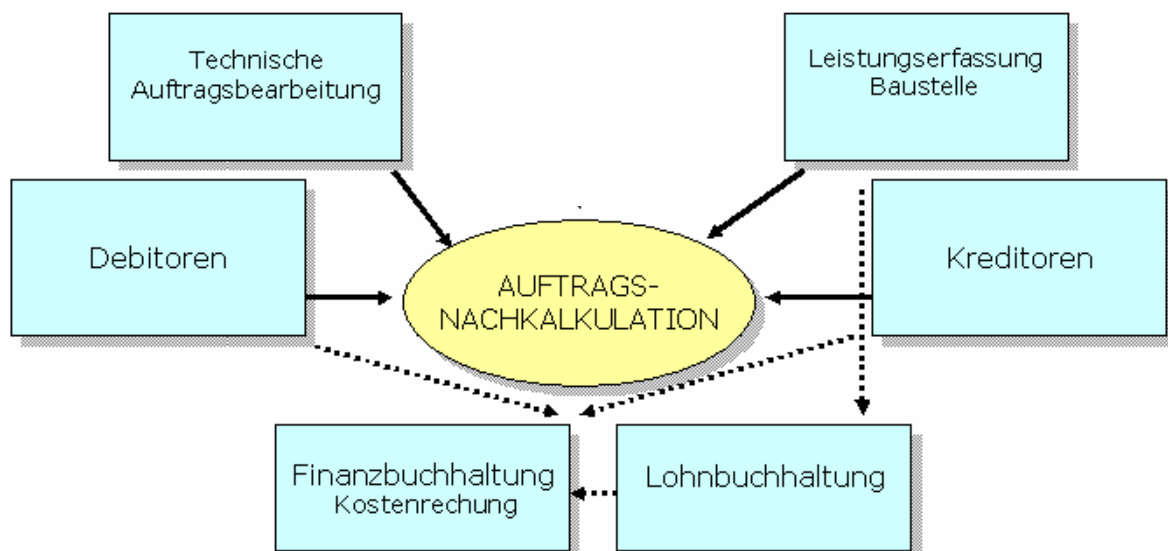



Auswertungsbeispiele

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Projektübersicht							01.01.2004 bis 31.12.2006
3								
4	Aufträge							
5								
6		Projektbeschreibung	Werkvertrag Total	verrechnet exkl. MwSt	nicht verrechnet exkl. MwSt	bez. Debitoren exkl. MwSt	überf. Debitoren exkl. MwSt	MwSt Betrag
7	Ertrag Akkord:							
8	Musterlb.dqd	Projekt Mettler Baumeisterarbeiten	56'386.00	50'377.55	0.00	37'173.50	5'826.50	3'828.70
9	Musterlc.dqd	Projekt Mettler Gartenarbeiten	12'737.85	12'585.36	0.00	929.38		956.55
10		Abgrenzungen und Fibubuchungen		-1'000.00				
11	Total Akkord		69'183.85	61'963.50	0.00	38'102.88	5'826.50	4'785.25
12								
13	Ertrag Regie:							
14	Musterlb.bau	Projekt Mettler Regierechnung	3'880.00	3'880.00	0.00	2'087.45		294.90
15	Total Regie		3'880.00	3'880.00	0.00	2'087.45	0.00	294.90
16								
17	Ertrag Pflanzlisten:							
18	musterlc.pfl	Pflanzliste		40'190.45		3'500.00		964.55
19	Total Pflanzlisten		0.00	40'190.45	0.00	3'500.00	0.00	964.55
20								
21	Total Ertrag:		73'063.85	106'033.95	0.00	43'690.33	5'826.50	6'044.70
22								
23	Kosten							
24			Selbstkosten	Gemeinkosten in %	Total			
25								
26	Total Personal		14'095.89	225.00	31'715.75			
27	Total Material		17'525.85	105.00	18'402.14			
28	Total Inventar		3'966.04	115.00	11'460.94			
29	Total Fremdleistungen		0.00	107.00	0.00			
30	Total Kreditoren Personal		0.00	225.00	0.00			
31	Total Kreditoren Material		21'366.15	105.00	22'434.46			
32	Total Kreditoren Inventar		0.00	115.00	0.00			
33	Total Kreditoren Fremdleistungen		0.00	107.00	0.00			
34	Total Fibu		3'432.00		3'432.00			
35	Total Kosten		66'385.92		87'445.28			
36								
37	Auswertung							
38			Franken	Prozent				
39								
40	Gewinn/Verlust		18'588.67	21.26				
41								
42	Total Stunden		539.50					
43	Umsatz pro Stunde		196.54					
44	Arbeitsvorrat (h WK - h Rapportiert)		682.19					
45	Arbeitsvorrat (h WK - h Ausmass)		832.45					
46	Debitoren offen		63'573.23					
47								

Auftragsnachkalkulation auf einen Blick

- Zusammenzug aller baustellenrelevanten Daten in SORBA-Programmen
- Auswertung nach diversen Kriterien (Z. Bsp: Verantwortlichkeit, Projekt etc.)
- Berücksichtigung der aktuellsten Daten
- Auswertung in Excel
- Abgrenzung nach Datum
- Abgrenzungen angefangener Arbeiten
- Wählbarer Detaillierungsgrad
