




## Auftragsnachkalkulation

### Aktueller kaufmännischer Stand der Baustelle

Um über den voraussichtlichen Erfolg oder Misserfolg einer Baustelle jederzeit informiert zu sein, ist die Bauführung darauf angewiesen, über möglichst aktuelle und vollständige Zahlen zu verfügen. Die Auftragsnachkalkulation versteht sich als Ergänzung zur kaufmännischen Kostenrechnung. In diesem Softwaremodul werden die aktuellsten Informationen aus allen installierten SORBA-Softwaremodule bezogen.

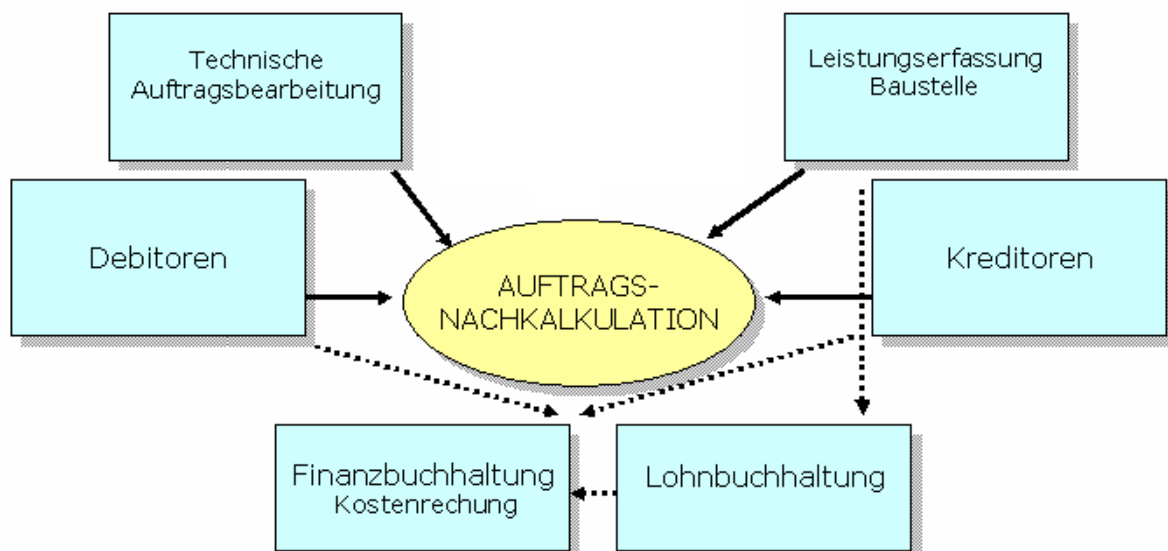



Auswertungsbeispiele

A	B	C	D	E	F	G	H	
1								
2	Projektübersicht							01.01.2004 bis 31.12.2006
3								
4								
5	<b>Aufträge</b>							
6								
7	<b>Ertrag Akkord:</b>	<b>Projektbeschreibung</b>	<b>Werkvertrag Total</b>	<b>verrechnet exkl. MwSt</b>	<b>nicht verrechnet exkl. MwSt</b>	<b>bez. Debitoren exkl. MwSt</b>	<b>überf. Debitoren exkl. MwSt</b>	<b>MwSt Betrag</b>
8	Muster1b.dgd	Projekt Mettler Bootsunterstand	56'386.00	50'377.55	0.00	37'173.50	5'826.50	3'828.70
9	Muster1c.dgd	Projekt Mettler Bootsrampe	12'797.85	12'585.95	0.00	929.38		956.55
10		Abgrenzungen und Fibubuchungen		-1'000.00				
11	<b>Total Akkord</b>		<b>69'183.85</b>	<b>61'963.50</b>	<b>0.00</b>	<b>38'102.88</b>	<b>5'826.50</b>	<b>4'785.25</b>
12								
13	<b>Ertrag Regie:</b>							
14	Muster1b.bau	Projekt Mettler Regiearbeiten	3'880.00	3'880.00	0.00	2'087.45		294.90
15	<b>Total Regie</b>		<b>3'880.00</b>	<b>3'880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'087.45</b>	<b>0.00</b>	<b>294.90</b>
16								
17	<b>Ertrag Pflanzlisten:</b>							
18	muster1c.pfl	Pflanzliste		40'190.45		3'500.00		964.55
19	<b>Total Pflanzlisten</b>		<b>0.00</b>	<b>40'190.45</b>	<b>0.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>964.55</b>
20								
21	<b>Total Ertrag:</b>		<b>73'063.85</b>	<b>106'033.95</b>	<b>0.00</b>	<b>43'690.33</b>	<b>5'826.50</b>	<b>6'044.70</b>
22								
23	<b>Kosten</b>							
24			<b>Selbstkosten</b>	<b>Gemeinkosten in %</b>	<b>Total</b>			
25								
26	Total Personal		14'095.89	225.00	31'715.75			
27	Total Material		17'525.85	105.00	18'402.14			
28	Total Inventar		9'966.04	115.00	11'460.94			
29	Total Fremdleistungen		0.00	107.00	0.00			
30	Total Kreditoren Personal		0.00	225.00	0.00			
31	Total Kreditoren Material		21'366.15	105.00	22'434.46			
32	Total Kreditoren Inventar		0.00	115.00	0.00			
33	Total Kreditoren Fremdleistungen		0.00	107.00	0.00			
34	Total Fibu		3'432.00		3'432.00			
35								
36	<b>Total Kosten</b>		<b>66'385.92</b>		<b>87'445.28</b>			
37								
38	<b>Auswertung</b>							
39			<b>Franken</b>	<b>Prozent</b>				
40	<b>Gewinn/Verlust</b>		<b>18'588.67</b>	<b>21.26</b>				
41								
42	Total Stunden		539.50					
43	Umsatz pro Stunde		196.54					
44	Arbeitsvorrat (h VK - h Rapportiert)		682.19					
45	Arbeitsvorrat (h VK - h Ausmass)		832.45					
46	Debitoren offen		63'573.23					

Auftragsnachkalkulation auf einen Blick

- Zusammenzug aller baustellenrelevanten Daten in SORBA-Programmen
- Auswertung nach diversen Kriterien (Z. Bsp: Verantwortlichkeit, Projekt etc.)
- Berücksichtigung der aktuellsten Daten
- Auswertung in Excel
- Abgrenzung nach Datum
- Abgrenzungen angefangener Arbeiten
- Wählbarer Detaillierungsgrad
