



## Auftrag-SOLL/IST

### Leistungen innerhalb der Baustelle kontrollieren

Das Controlling einer Baustelle wird durch das Softwaremodul Auftrag-SOLL/IST unterstützt. Die Baustelle wird dabei in verschiedene Arbeitsvorgänge unterteilt, welche vom Programm mit den entsprechenden SOLL/IST-Daten ausgefüllt werden. Dabei wird der aktuelle Baufortschritt berücksichtigt.

The screenshot shows a software window titled 'Vorgänge bearbeiten'. It features a menu bar with 'Favoriten', 'Bearbeiten', and 'Fenster'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Suchen', 'Suchen fortsetzen', 'Text bearbeiten', and 'Fenster'. The main area contains a table with the following data:

Element-Code	Text	Regi
UNT	Unterhaltsarbeiten Abo-Kunden	<input type="checkbox"/>
Neu	Neuanlagen	<input type="checkbox"/>
UMA	Umänderungen	<input type="checkbox"/>
REG	Unterhaltsarbeiten Regie	<input checked="" type="checkbox"/>
*		<input type="checkbox"/>

At the bottom of the window, there is a status bar showing 'Record 59' and 'CAP NUM'.

### Vergleiche

In verschiedenen Detaillierungsgraden werden die Mengen, Totalstunden und Kosten verglichen. Dabei stehen die Informationen aus der Vorkal-

kulation, dem Arbeitsfortschritt, dem Ausmass und den Rapporten gegenüber.



**Auswertungsbeispiele**



Kostenelemente Soll - Ist Vergleich

14.08.2006

MFH Ebneten

Bezeichnung	EH	Menge					Franken				
		Kalk	Soll	Ist	Kalk/Ist	Soll/Ist	Kalk	Soll	Ist	Kalk/Ist	Soll/Ist
<b>113 Total Umänderungen</b>		<b>102.00</b>	<b>81.60</b>	<b>92.00</b>	<b>102.00</b>	<b>81.60</b>	<b>42'472.61</b>	<b>33'978.09</b>	<b>36'440.00</b>	<b>42'472.61</b>	<b>33'978.09</b>
<b>151 Gartenarbeiten</b>											
<b>Lohn</b>											
13431112 Vorarbeiter	h	15.19	3.04		15.19	3.04	379.61	75.92		379.61	75.92
72120013 Gartenbauer	h	2.61	0.52		2.61	0.52	65.35	13.07		65.35	13.07
72300012 Lehrlinge	h	0.36	0.07		0.36	0.07	9.00	1.80		9.00	1.80
<b>L Total Lohn</b>		<b>18.16</b>	<b>3.63</b>	<b>3.00</b>	<b>18.16</b>	<b>3.63</b>	<b>453.96</b>	<b>90.79</b>	<b>140.00</b>	<b>453.96</b>	<b>90.79</b>
<b>Material</b>											
52131500 Beton und Steine							384.19	76.84		384.19	76.84
61433200 Kies und Sand							57.74	11.55		57.74	11.55
63125200 Deponiegebühren							18.64	3.73		18.64	3.73
63125203 Pflanzen							16.36	3.27		16.36	3.27
<b>I Total Material</b>							<b>476.93</b>	<b>95.39</b>	<b>93.00</b>	<b>476.93</b>	<b>95.39</b>
<b>151 Total Gartenarbeiten</b>		<b>18.16</b>	<b>3.63</b>	<b>3.00</b>	<b>18.16</b>	<b>3.63</b>	<b>930.89</b>	<b>186.18</b>	<b>233.00</b>	<b>930.89</b>	<b>186.18</b>
<b>311 Total</b>		<b>20.64</b>	<b>20.64</b>	<b>3.00</b>	<b>20.64</b>	<b>20.64</b>	<b>991.84</b>	<b>991.84</b>	<b>753.00</b>	<b>991.84</b>	<b>991.84</b>
<b>V Total Vorgänge</b>		<b>140.80</b>	<b>105.87</b>	<b>98.00</b>	<b>140.80</b>	<b>105.87</b>	<b>44'395.34</b>	<b>35'156.11</b>	<b>37'426.00</b>	<b>44'395.34</b>	<b>35'156.11</b>

\_\_\_\_\_

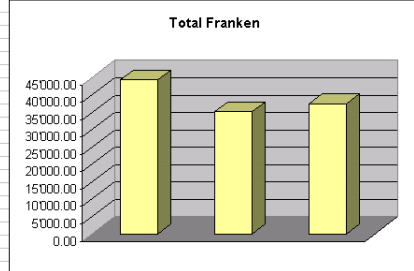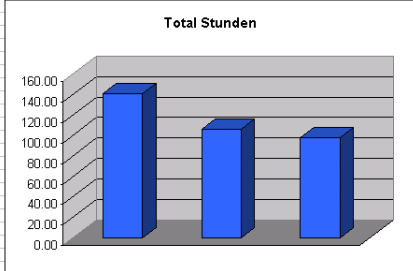

**Auftrag-SOLL/IST auf einen Blick**

- Auswertung in verschiedenen Detaillierungsgraden
- Auswertung in Excel
- Graphische Auswertung
- Beliebige Definition von Arbeitsvorgängen
- SOLL/IST nach Vorkalkulation, Arbeitsfortschritt, Ausmass und Rapporten
