



Auftrag-SOLL/IST

Leistungen innerhalb der Baustelle kontrollieren

Das Controlling einer Baustelle wird durch das Softwaremodul Auftrag-SOLL/IST unterstützt. Die Baustelle wird dabei in verschiedene Arbeitsvorgänge unterteilt, welche vom Programm mit den entsprechenden SOLL/IST-Daten ausgefüllt werden. Dabei wird der aktuelle Baufortschritt berücksichtigt.

Element-Code	Text	Regie
100	Werkstatt	<input type="checkbox"/>
150	Offerten	<input type="checkbox"/>
120	Montage	<input type="checkbox"/>
140	Planungen	<input type="checkbox"/>
160	Reinigungen, Aufräumen, Materialablad	<input type="checkbox"/>
130	Büro	<input type="checkbox"/>
105	Tafelschere	<input type="checkbox"/>
110	Abkantpresse	<input type="checkbox"/>
125	Transport	<input type="checkbox"/>
170	Schulung intern	<input type="checkbox"/>

Vergleiche

In verschiedenen Detaillierungsgraden werden die Mengen, Totalstunden und Kosten verglichen. Dabei stehen die Informationen aus der Vorkal-



kulation, dem Arbeitsfortschritt, dem Ausmass und den Rapporten gegenüber.



Auswertungsbeispiele

Kostenelemente Soll - Ist Vergleich 14.08.2006
MFH Ebneten

Bezeichnung	EH	Menge					Franken				
		Kalk	Soll	Ist	Kalk/Ist	Soll/Ist	Kalk	Soll	Ist	Kalk/Ist	Soll/Ist
Metallbau											
L Lohn											
3431112 Werkstatt	h	15.19	3.04		15.19	3.04	379.61	75.92		379.61	75.92
2120013 Montage	h	2.61	0.52		2.61	0.52	65.35	13.07		65.35	13.07
2300012 Planung	h	0.36	0.07		0.36	0.07	9.00	1.80		9.00	1.80
L Total Lohn		18.16	3.63	3.00	18.16	3.63	453.96	90.79	140.00	453.96	90.79
M Material											
2131500 Stahl		312.00	66.00		312.00	66.00	384.19	76.84		384.19	76.84
61433200 Aluminium		50.00	9.00		50.00	9.00	57.74	11.55		57.74	11.55
63125200 Kleinmaterial		17.50	4.00		17.50	4.00	18.64	3.73		18.64	3.73
63125203 Verzinkerei		2.00	3.00		2.00	3.00	16.36	3.27		16.36	3.27
M Total Material							476.93	95.39	93.00	476.93	95.39
151 Total Metallarbeiten		208.91	44.63	3.00	208.91	44.63	930.89	186.18	233.00	930.89	186.18
V Total Vorgänge		331.55	146.87	98.00	331.55	146.87	44'395.34	35'156.11	37'426.00	44'395.34	35'156.11

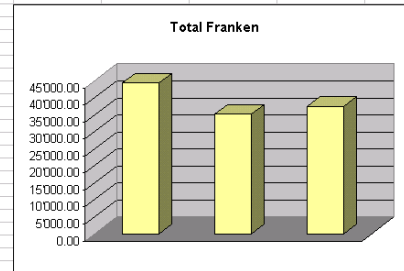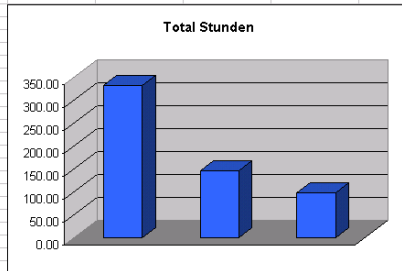

Auftrag-SOLL/IST auf einen Blick

- Auswertung in verschiedenen Detaillierungsgraden
- Auswertung in Excel
- Graphische Auswertung
- Beliebige Definition von Arbeitsvorgängen
- SOLL/IST nach Vorkalkulation, Arbeitsfortschritt, Ausmass und Rapporten
